




# RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2018



## AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA



# PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL - PDES

La Agenda 2025 señala que:

“El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con medios provistos, organizados y promovidos por el Estado para acceder, de manera expedita y adecuada a sus condiciones económicas y sociales, a viviendas dignas, con servicios básicos, que les permitan vivir bien”.



## Resultado 2020 - PDES

Se ha reducido al menos 10% del déficit habitacional.

Se han construido 51.290 viviendas considerando la vulnerabilidad al cambio climático:

- 36.510 unifamiliares
- 9.140 multifamiliares
- 5.640 (reposición) por atención de desastres

Se han mejorado ampliado y/o renovado 63.710 viviendas con eficiencia energética

Total 115.000 viviendas



Estado Plurinacional de Bolivia



AEVIENDA



Obras



# MARCO ESTRATÉGICO



Estado Plurinacional de Bolivia



AEVIVIENDA



Obras  
Públicas

## MISIÓN

“La AEVIVIENDA, es una institución pública descentralizada y especializada en reducir el déficit habitacional, facilitando el derecho al acceso a una vivienda adecuada y asequible a los hogares bolivianos, ejecutando programas integrales concurrentes que construyen equidad social y calidad de vida.”

## VISIÓN

“Al 2020, somos una institución pública de excelencia socialmente reconocida, que formula, lidera, coordina y ejecuta la política boliviana de vivienda social, hábitat y territorio, en el marco de una convivencia comunitaria en armonía con la Madre Tierra para Vivir Bien.”



## PROGRAMACIÓN PLURIANUAL 2016-2020

- El Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional (PPRDH) se operativiza a través de la Programación Operativa Anual (POA)
- El PPRDH expresa los lineamientos estratégicos operativos adecuados para implementar los programas y/o proyectos de vivienda social del nivel central del Estado, desarrollados en los objetivos, estrategias y metas a nivel departamental y municipal; en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien.

Departamento	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	%
BENI	2.688	1.032	1.186	1.186	1.238	7.330	6%
CHUQUISACA	2.043	1.412	1.624	1.624	1.694	8.396	7%
COCHABAMBA	4.039	3.186	3.664	3.664	3.823	18.376	16%
LA PAZ	3.590	5.071	5.833	5.833	6.086	26.413	23%
ORURO	1.705	1.410	1.622	1.622	1.693	8.052	7%
PANDO	1.475	562	646	646	674	4.003	3%
POTOSI	2.004	2.382	2.739	2.739	2.858	12.721	11%
SANTA CRUZ	5.492	3.939	4.529	4.529	4.726	23.216	20%
TARIJA	1.964	1.006	1.157	1.157	1.208	6.493	6%
<b>TOTALES</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>	<b>115.000</b>	<b>100%</b>

Fuente: PPRDH- AEVIVIENDA



Estado Plurinacional de Bolivia



AEVIVIENDA



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA





## ¿Cuáles son los Programas de la AEVIVIENDA?

1 Cualitativos de Vivienda Social



2 Construcción de Vivienda Nueva



Comunidades Urbanas

3



4 Desastres y/o Emergencias



5 Financiamiento de Inmuebles



6 Habitacionales de Atención Extraordinaria



# CONCLUSIÓN DE VIVIENDAS 2006 - 2018 (PVS – UEVE - AEVIVIENDA)



1987

1992

1997

2006

2018

6.810 Viviendas  
construidas

23.676 Viviendas  
Construidas y  
mejoradas

21.335 Viviendas  
Construidas y  
mejoradas

151.058 Viviendas Construidas y mejoradas  
(A diciembre 2018)

Fondo Nacional de  
Vivienda  
(FONVI)

Fondo Nacional  
para la Vivienda  
Social  
(FONVIS)

Progr. Nal. de  
Subsidio a la  
Vivienda – PNSV  
Progr. de  
Financiamiento de  
Vivienda – PFV

Programa de Vivienda Social y Solidaria  
Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia  
Agencia Estatal de Vivienda

PERIODO NEOLIBERAL


PERIODO DEL PROCESO DE CAMBIO

51.821 viviendas en 19 años  
PROM 2.727 viviendas / año

151.058 viviendas en 13 años  
PROM 11.620 viviendas/año

212.466 Beneficiarios

581.932 Beneficiarios



Fuente: La Vivienda en Bolivia: diagnóstico y políticas- UDAPSO, pág.. 75 y 87  
Memoria institucional del gobierno de Banzer.

Fuente: Agencia Estatal de Vivienda - AEVIVIENDA

# VIVIENDAS CONSTRUIDAS Y ENTREGADAS 2006 -2018




Estado Plurinacional de Bolivia



AEVIVIENDA



Obras

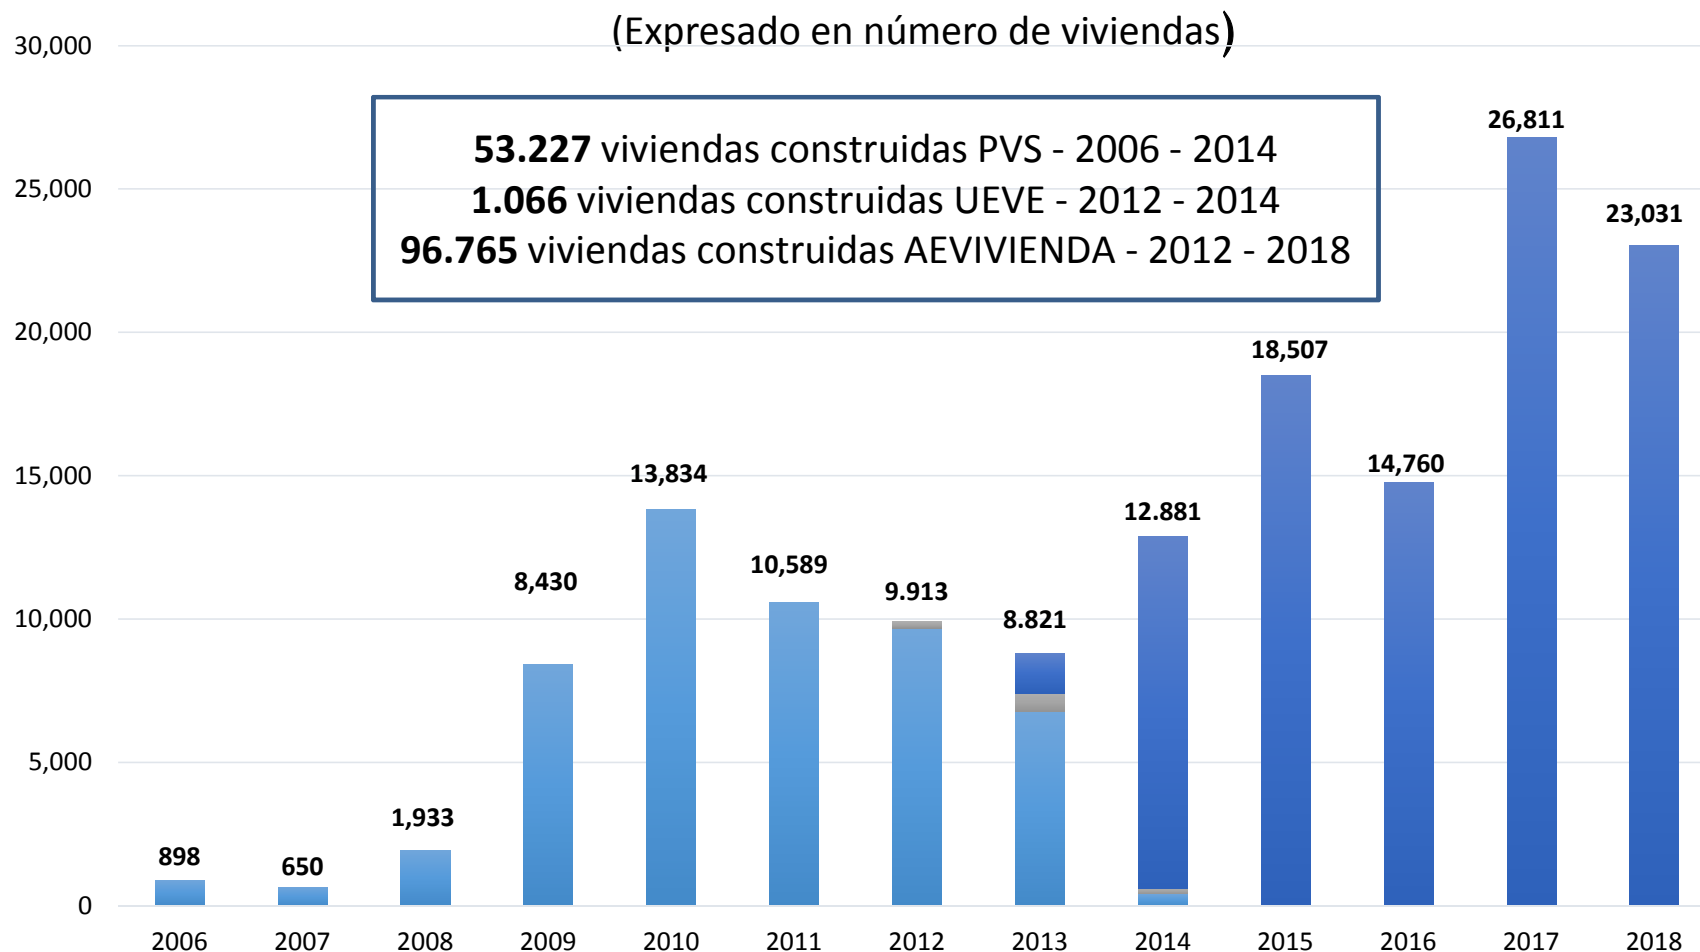

Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información - AEVIVIENDA

■ PVS ■ UEVE ■ AEVIVIENDA



# CONCLUSIÓN DE VIVIENDAS POR DEPARTAMENTO 2006 – 2018



Estado Plurinacional de Bolivia



Departamento	PVS*	UEVE*	AEVIVIENDA*	TOTAL	%
BENI	2.547	16	6.948	9.511	6%
CHUQUISACA	8.803	-	9.601	18.404	12%
COCHABAMBA	4.436	261	16.422	21.119	14%
LA PAZ	9.448	603	16.780	26.831	18%
ORURO	2.847	-	7.233	10.080	7%
PANDO	652	106	4.114	4.872	3%
POTOSI	4.076	-	9.198	13.274	9%
SANTA CRUZ	6.246	68	19.556	25.870	17%
TARIJA	14.172	12	6.913	21.097	14%
<b>TOTAL</b>	<b>53.227</b>	<b>1.066</b>	<b>96.765</b>	<b>151.058</b>	<b>100%</b>

Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información - AEVIVIENDA

\*PVS: Programa de Vivienda Social y Solidaria.

\*UEVE: Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia.

\*AEVIVIENDA: Agencia Estatal de Vivienda.





# INVERSIÓN EJECUTADA EN LA CONCLUSIÓN DE VIVIENDAS 2006-2018



Estado Plurinacional de Bolivia



AEVIVIENDA

Departamento	Presupuesto Ejecutado (En Bs)				
	Programa de Vivienda Social y Solidaria - PVS	Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia - UEVE	Agencia Estatal de Vivienda - AEVIVIENDA	Total (En Bs.)	%
BENI	173.870.988	1.460.794	499.770.239	675.102.021	9%
CHUQUISACA	104.207.951	-	520.532.994	624.740.945	8%
COCHABAMBA	124.470.090	27.902.651	1.165.798.024	1.318.170.765	17%
LA PAZ	334.633.027	82.399.885	1.104.792.369	1.521.825.281	19%
ORURO	99.760.638	-	378.813.140	478.573.778	6%
PANDO	34452568,27	16.068.241	306.316.469	356.837.278	5%
POTOSI	93.574.238	-	468.899.390	562.473.628	7%
SANTA CRUZ	316.968.885	9.515.895	1.421.052.701	1.747.537.481	22%
TARIJA	189.955.741	1.089.600	340.080.299	531.125.640	7%
<b>TOTAL</b>	<b>1.471.894.126</b>	<b>138.437.066</b>	<b>6.206.055.626</b>	<b>7.816.386.818</b>	<b>100%</b>

Fuente: Agencia Estatal de Vivienda – AEVIVIENDA


Nota: (\*) Reporte SAP-MOPSV a diciembre de 2018



# CONCLUSIÓN DE VIVIENDAS POR TIPO DE INTERVENCIÓN - AEVIVIENDA



➤ Desde el año 2013 la AEVIVIENDA pasó de una atención eminentemente cuantitativa a una atención mayoritariamente cualitativa, consecuentemente hasta el año 2018 ha entregado (65.590) soluciones habitacionales cualitativas y (31.175) soluciones habitacionales cuantitativas.

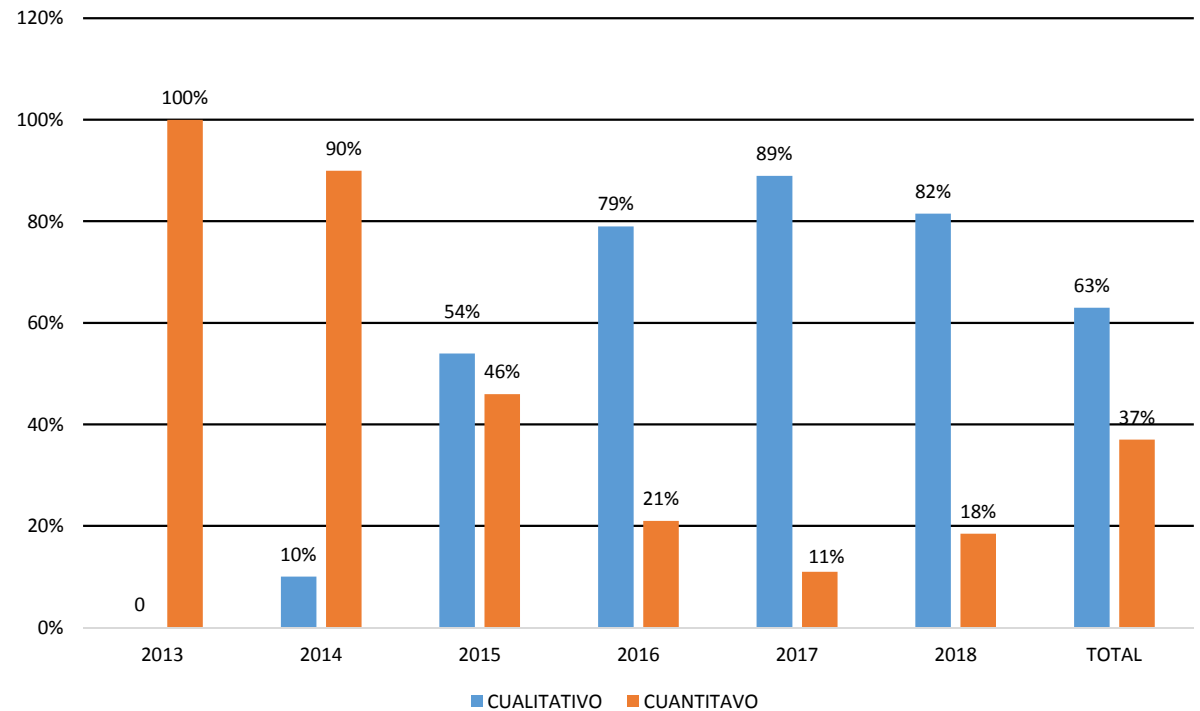

TIPO/GESTIÓN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
CUALITATIVO	-	1.265	10.053	11.622	23.878	18.772	65.590
CUANTITATIVO	1.394	10.997	8.454	3.138	2.933	4.259	31.175
TOTAL	1.394	12.262	18.507	14.760	26.811	23.031	96.765

Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información - AEVIVIENDA

## COBERTURA A NIVEL MUNICIPAL (PVS – UEVE - AEVIVIENDA)



Escudo Plurinacional de Bolivia



AEVIVIENDA

- A partir de la gestión 2006 con la implementación de programas de vivienda social (PVS – UEVE - AEVIVIENDA) se ha alcanzado una cobertura del 100% en los departamentos de Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Tarija.
- A nivel nacional se logro el 97% de cobertura respecto los 339 municipios del Estado Plurinacional de Bolivia.

DEPARTAMENTO	NÚMERO DE MUNICIPIOS	MUNICIPIOS ATENDIDOS	% DE COBERTURA MUNICIPAL
BENI	19	19	100%
CHUQUISACA	29	29	100%
COCHABAMBA	47	47	100%
LA PAZ	87	83	95%
ORURO	35	34	97%
PANDO	<b>15</b>	<b>11</b>	73%
POTOSI	40	40	100%
SANTA CRUZ	56	55	98%
TARIJA	11	11	100%
<b>TOTALES</b>	<b>339</b>	<b>329</b>	<b>97%</b>

Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información - AEVIVIENDA



Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

# ATENCIÓN DE SECTORES VULNERABLES - AEVIVIENDA



21.306

Mujeres Jefas de Hogar



12.153

Adultos Mayores



3.775

Personas con discapacidad

DEPARTAMENTO	MADRES SOLTERAS	ADULTOS MAYORES	FAMILIAS CON MIEMB. CON DISCAPACIDAD	TOTAL
BENI	1.730	889	230	2.849
CHUQUISACA	2.378	2.098	475	4.951
COCHABAMBA	2.306	1.480	401	4.187
LA PAZ	3.813	2.378	664	6.855
ORURO	1.465	885	281	2.631
PANDO	679	369	106	1.154
POTOSI	1.521	843	396	2.760
SANTA CRUZ	4.481	1.950	742	7.173
TARIJA	2.933	1.261	480	4.674
<b>Totales</b>	<b>21.306</b>	<b>12.153</b>	<b>3.775</b>	<b>37.234</b>

Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información - AEVIVIENDA

La Agencia Estatal de Vivienda, durante las gestiones 2013-2018, concluyó 151.058 soluciones habitacionales, de las cuales 37.234 (25%) se destinaron a sectores vulnerables.






# RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2018



# INFORME 2018



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DESAGREGADA 2018 (POR DEPARTAMENTO en Bs.)



Estado Plurinacional de Bolivia




AEVIVIENDA



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, GESTIÓN Y VIVIENDA

	BENI	CHUQUISACA	COCHABAMBA	LA PAZ	ORURO	PANDO	POTOSÍ	SANTA CRUZ	TARIJA	TOTALES
PROGRAMACIÓN	54.139.572	85.467.601	202.956.026	333.508.960	62.259.611	54.653.702	122.227.403	291.179.651	58.916.006	1.265.308.533
EJECUCIÓN	67.681.376	86.955.046	197.291.781	219.676.730	65.238.557	46.774.544	111.420.396	323.251.229	64.200.115	1.182.489.775
% CUMPLIMIENTO ANUAL	125%	102%	97%	66%	105%	86%	91%	111%	109%	93%

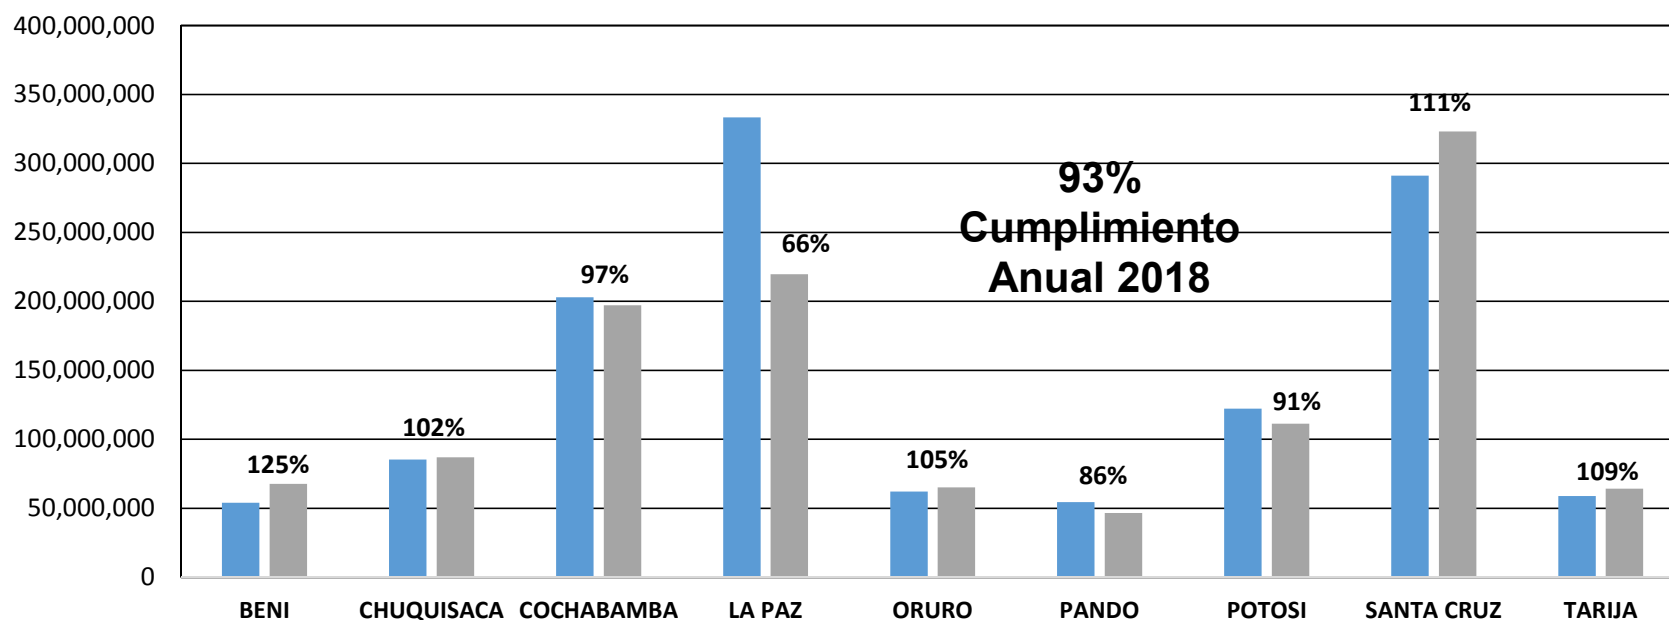

Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información – AEVIVIENDA  
Datos reportados al MOPSV, Sistema de Administración de Proyectos




# EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL – 2018

## (en Número de Soluciones Habitacionales)



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOV	DICIEM	TOTALES
PROGRAMACIÓN	1.868	1.452	2.101	1064	725	548	178	1.748	3.744	5.502	6.043	7.171	32.144
EJECUCIÓN	1.150	409	1.335	719	1272	751	482	795	1357	3.252	5.295	6.214	23.031

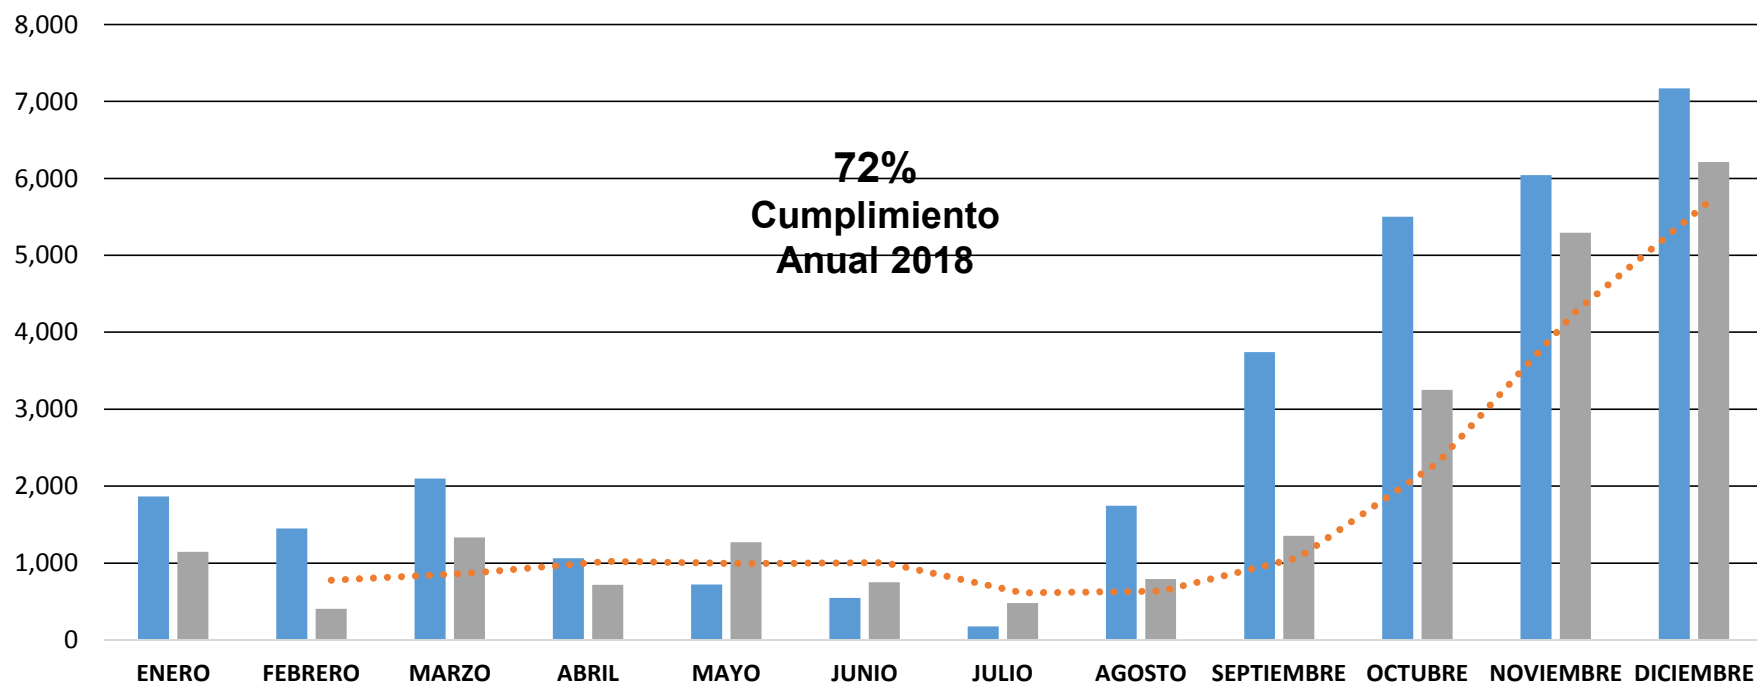

Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información - AEVIENDA

(\*) Incluye Saldo 2017: 8.951 S.H. Concluidas 2018




## Nº DE PROYECTOS CONCLUIDOS GESTIÓN 2018



DEPTO.	S.H. PROG.	S.H. EJEC.	%
BENI	1.961	1.096	56%
CHUQUISACA	2.028	1.790	88%
COCHABAMBA	4.185	4.073	97%
LA PAZ	9.000	5.021	56%
ORURO	2.341	1.928	82%
PANDO	1.132	1.003	89%
POTOSI	3.155	2.559	81%
SANTA CRUZ	6.556	4.185	64%
TARIJA	1.786	1.376	77%
<b>TOTAL</b>	<b>32.144</b>	<b>23.031</b>	<b>72%</b>

Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información - AEVIVIENDA

23.031 SH, corresponden al 72% de la programación, distribuidas:

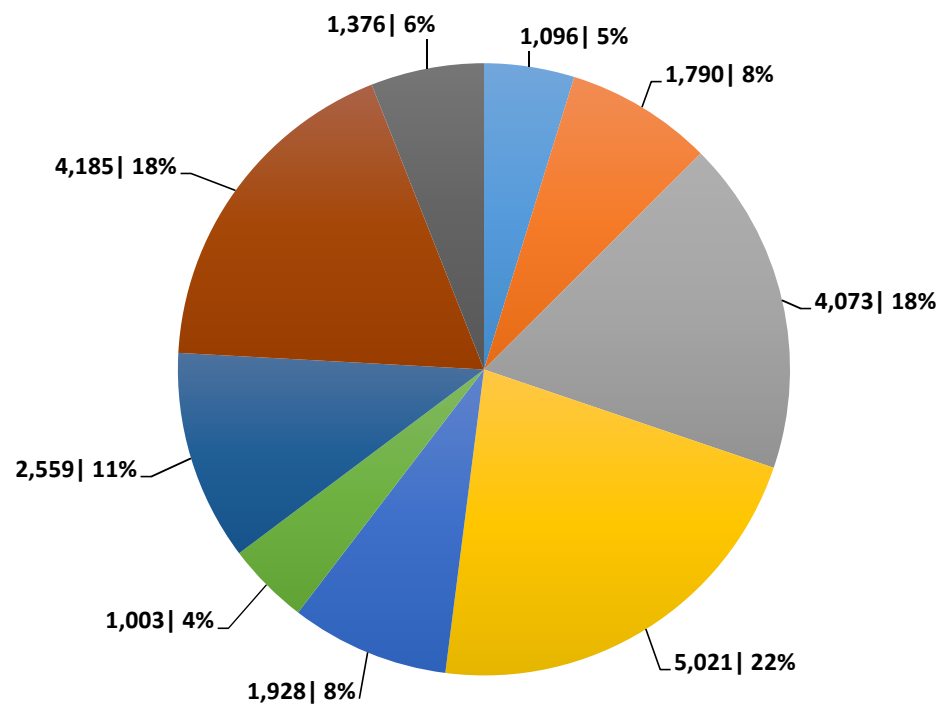


■ BENI ■ CHUQUISACA ■ COCHABAMBA ■ LA PAZ ■ ORURO ■ PANDO ■ POTOSI ■ SANTA CRUZ ■ TARIJA





# MAPA DE INTERVENCIÓN PROYECTOS COMPROMETIDOS BENI META 2018: 1.961 SH

MUNICIPIO	S.H.	S.H.
	PROG.	EJEC.
BAURES	29	
EXALTACION	57	57
GUAYARAMERIN	169	109
HUACARAJE	31	20
LORETO	40	
MAGDALENA	94	72
REYES	24	
RIBERALTA	447	296
RURRENABAQUE	80	80
SAN ANDRES	51	24
SAN BORJA	137	69
SAN IGNACIO	224	61
SAN JAVIER	39	24
SAN JOAQUIN	50	
SAN RAMON	20	20
SANTA ANA DE YACUMA	99	99
SANTA ROSA	24	
TRINIDAD	346	165
<b>TOTAL</b>	<b>1.961</b>	<b>1.096</b>

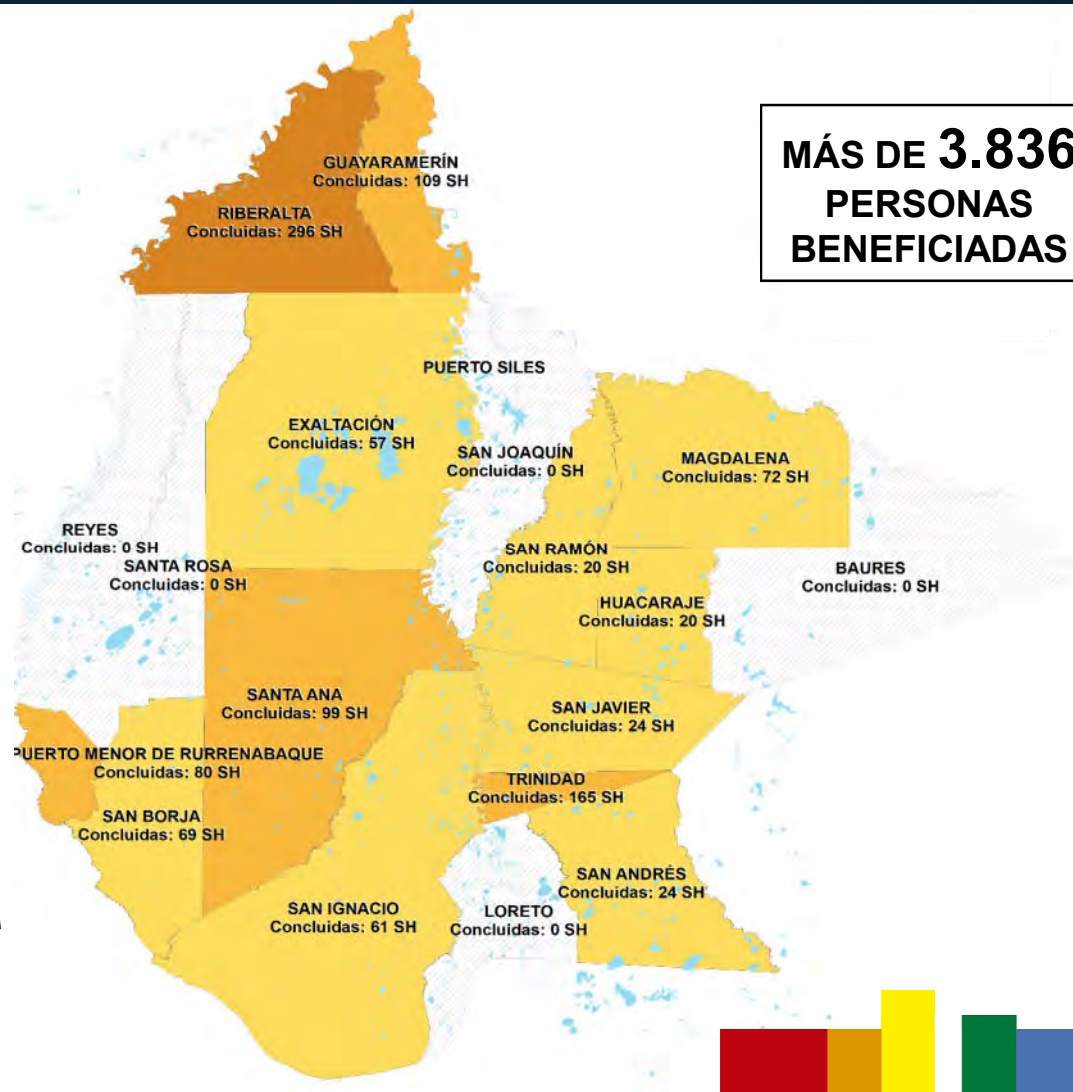

Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información - AEVIVIENDA



Estado Plurinacional de Bolivia



AEVIVIENDA



Ministerio del Urbanismo, Construcción y Vivienda

# MAPA DE INTERVENCIÓN PROYECTOS COMPROMETIDOS CHUQUISACA - META 2018: 2.028 SH



Estado Plurinacional de Bolivia




AEVIVIENDA



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA


MUNICIPIO	S.H. PROG.	S.H. EJEC.
AZURDUY	75	40
CAMARGO	65	65
CULPINA	47	47
EL VILLAR	25	25
HUACARETA	24	24
ICLA	25	25
INCAHUASI	42	42
LAS CARRERAS	28	28
MACHARETI	39	39
MOJOCOYA	41	41
MONTEAGUDO	80	34
MUYUPAMPA	28	28
PADILLA	40	40
POROMA	40	40
PRESTO	40	40
SAN LUCAS	65	65
SOPACHUY	30	30
SUCRE	958	801
TARABUCO	35	35
TARVITA	30	30
TOMINA	40	40
VILLA ABECIA	54	54
VILLA ALCALA	20	20
VILLA CHARCAS	45	45
VILLA SERRANO	27	27
YAMPARAEZ	22	22
YOTALA	19	19
ZUDAÑEZ	44	44
<b>TOTAL</b>	<b>2.028</b>	<b>1.790</b>

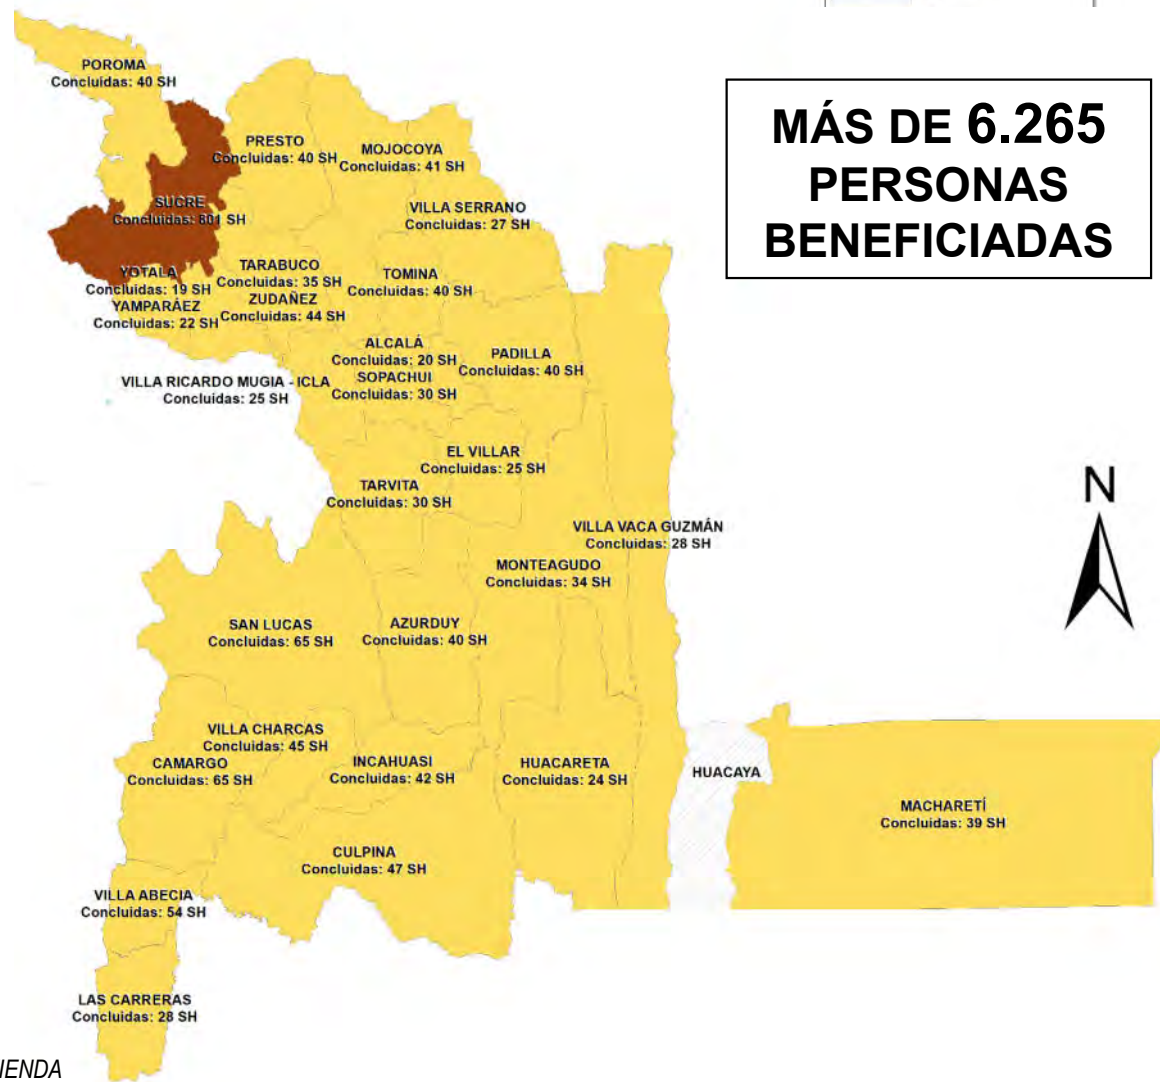

Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información - AEVIVIENDA

# MAPA DE INTERVENCIÓN PROYECTOS COMPROMETIDOS COCHABAMBA – META 2018: 4.185 SH

MUNICIPIO	S.H. PROG.	S.H. EJEC.
ALALAY	30	30
ANZALDO	30	30
ARBIETO	46	46
ARQUE	2	2
CAPINOTA	33	33
CLIZA	58	58
COCAPATA	39	39
COCHABAMBA	1.676	1.676
COLCAPIRHUA	103	103
COLOMI	49	49
CUCHUMUELA	62	62
ENTRE RIOS	91	91
MIZQUE	120	120
OMEREQUE	25	25
PASORAPA	47	47
POCONA	31	31
PUERTO VILLARROEL	220	220
PUNATA	2	2
QUILLACOLLO	297	246
SACABA	142	142
SAN BENITO	47	47
SANTIVANEZ	27	27
SHINAHOTA	74	74
SICAYA	30	30
TACACHI	23	23
TACOPAYA	48	-
TAPACARI	77	77
TIQUIPAYA	106	93
TOCO	53	53
TOLATA	52	52
TOTORA	65	65
VILLA TUNARI	398	398
VINTO	82	82
<b>TOTAL</b>	<b>4.185</b>	<b>4.073</b>

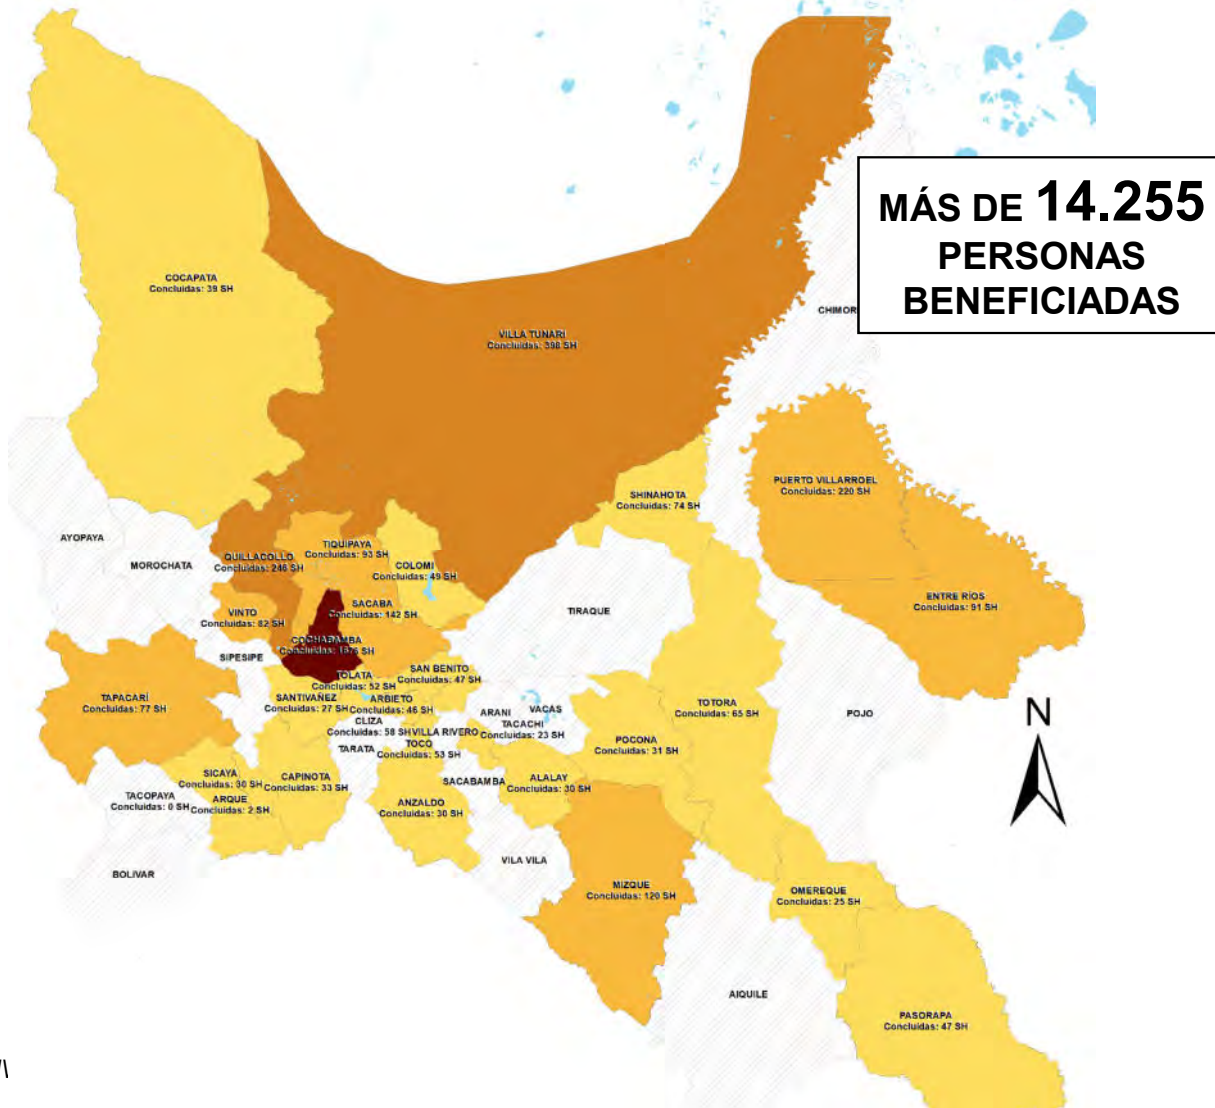

Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información - AEVI



# MAPA DE INTERVENCIÓN PROYECTOS COMPROMETIDOS

## LA PAZ – META 2018: 9.000 SH



Estado Plurinacional de Bolivia




AEVIVIENDA



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA

MUNICIPIO	S.H. PROG.	S.H. EJEC.
ALTO BENI	177	177
APOLO	200	200
AUCAPATA	64	64
BATALLAS	224	100
CALAMARCA	56	56
CAQUIAVIRI	73	-
CARANAVI	157	157
CATACORA	69	69
CHARAZANI	98	98
CHULUMANI	119	119
CHUMA	218	218
COLLANA	103	103
COLQUIRI	73	73
CORIPATA	100	-
EL ALTO	3.242	1.461
GUANAY	137	39
HUMANATA	56	-
ICHOCA	90	90
IXIAMAS	123	-
LA ASUNTA	160	160
LA PAZ	1.568	790
LURIBAY	23	23
MECAPACA	170	70
MOCOMOCO	1	1
PALCA	65	-
PALOS BLANCOS	200	-
PAPEL PAMPA	94	-
PUCARANI	220	-
PUERTO ACOSTA	144	144
QUIME	51	51
SAN ANDRÉS DE MACHACA	97	-
SAN BUENAVENTURA	121	121
SANTIAGO DE CALLAPA	62	-
SAPAHAQUI	105	105
SICA SICA	133	133
TACACOMA	130	130
TIPUANI	8	-
VIACHA	94	94
VILLA LIBERTAD LICOMA	122	122
YANACACHI	53	53
<b>TOTAL</b>	<b>9.000</b>	<b>5.021</b>

**MÁS DE 17.573 PERSONAS BENEFICIADAS**

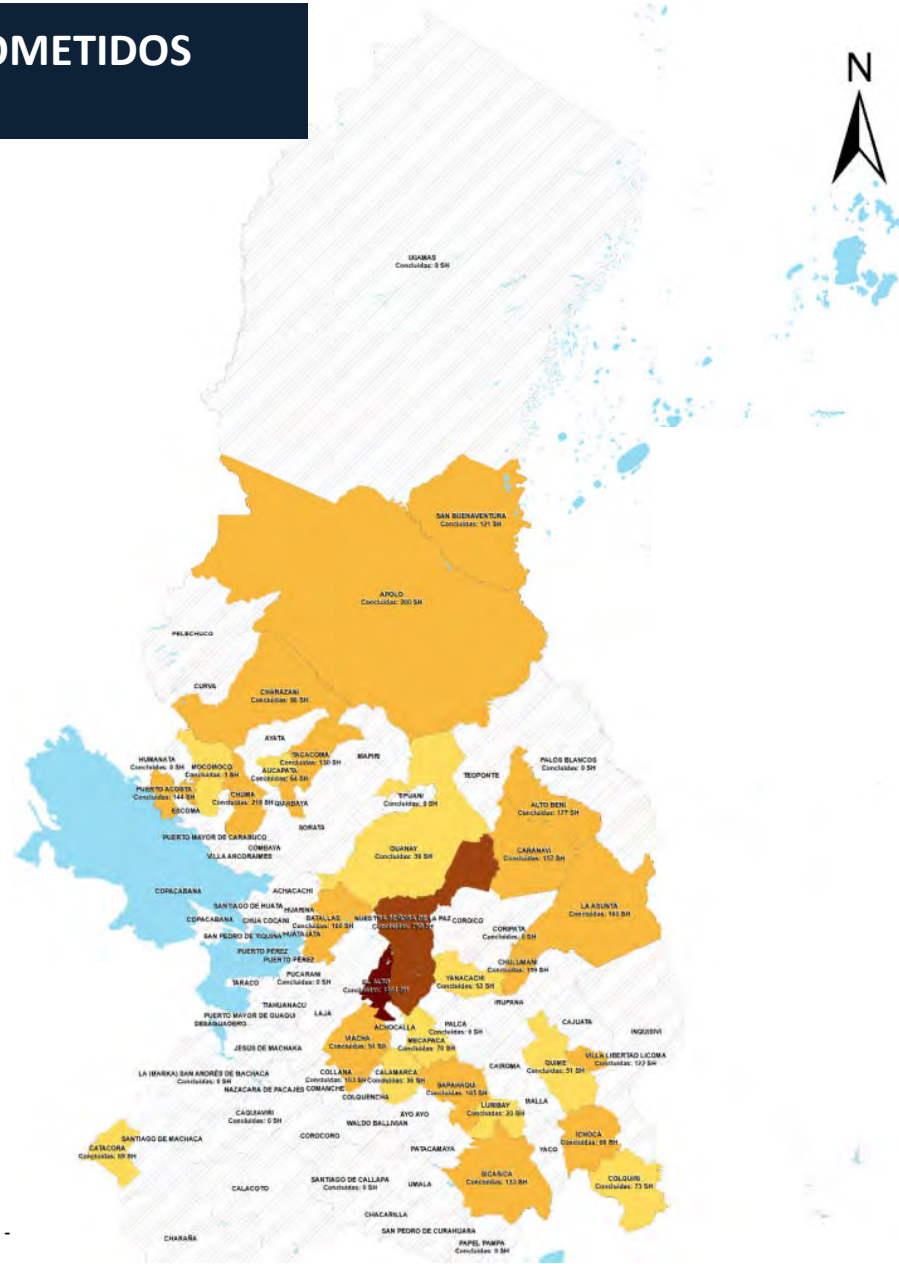

Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información -

# MAPA DE INTERVENCIÓN PROYECTOS COMPROMETIDOS ORURO – META 2018: 2.341 SH




Escudo Plurinacional de Bolivia



AEVIVIENDA

MUNICIPIO	S.H. PROG.	S.H. EJEC.
ANTEQUERA	26	-
CARACOLLO	246	246
CHALLAPATA	100	100
CHIPAYA	42	42
CHOQUE COTA	27	27
CURAHUARA DE CARANGAS	34	34
ESCARA	44	44
EUCALIPTUS	49	49
HUANUNI	22	-
HUARI	100	100
HUAYLLAMARCA	30	30
MACHACAMARCA	30	30
ORURO	1.275	910
POOPO	20	20
QUILLACAS	40	40
SALINAS DE GARCÍ MENDOZA	45	45
SAN PEDRO DE TOTORA	37	37
SANTIAGO DE ANDAMARCA	60	60
SORACACHI	80	80
TOLEDO	34	34
<b>TOTAL</b>	<b>2.341</b>	<b>1.928</b>

Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información - AEVIVIENDA

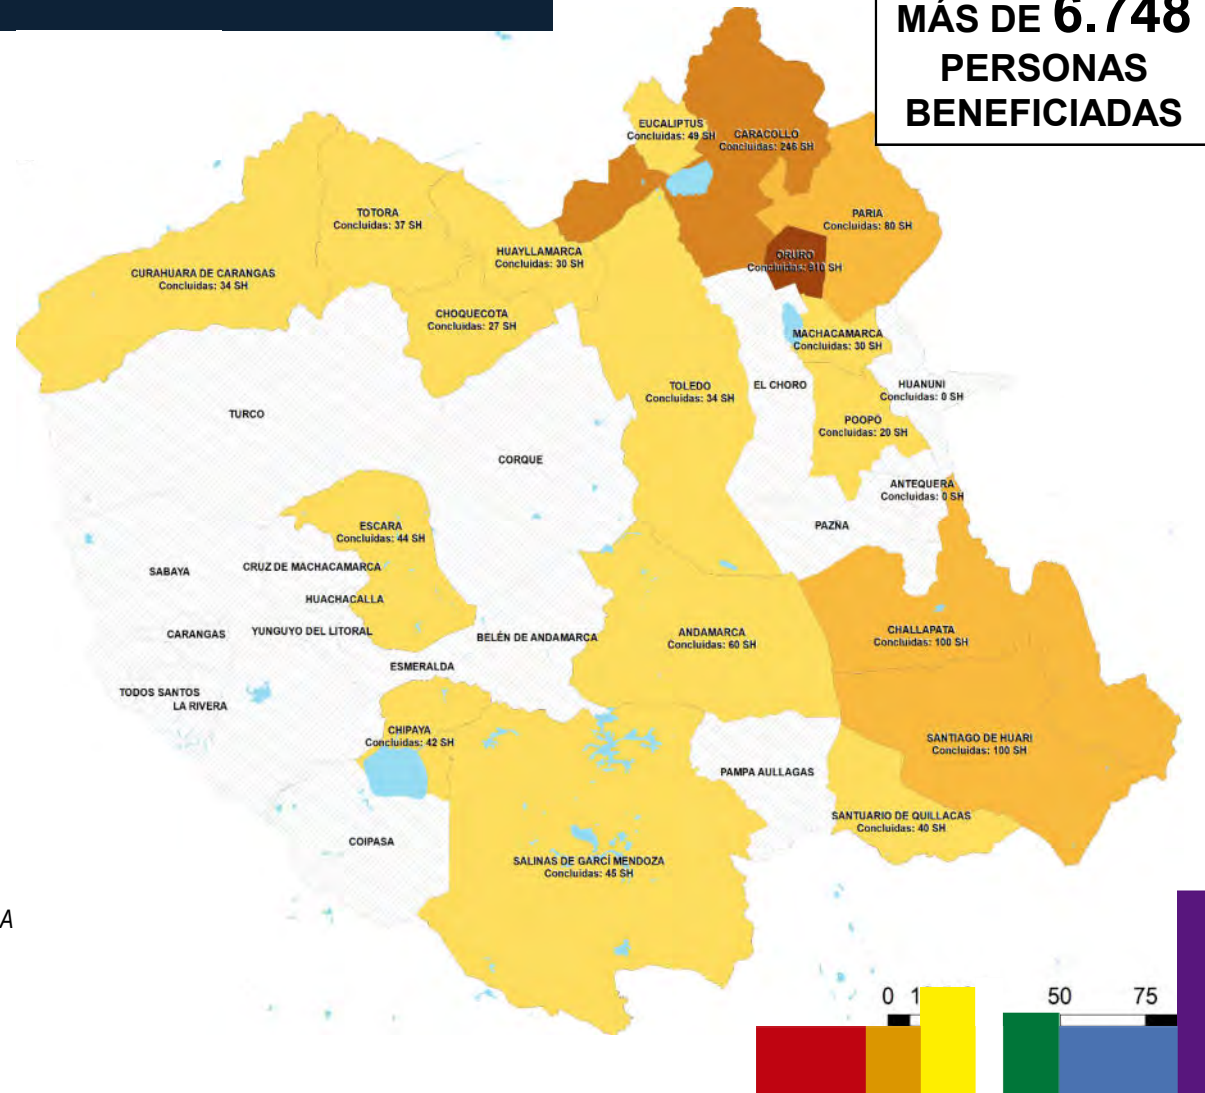


MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

# MAPA DE INTERVENCIÓN PROYECTOS COMPROMETIDOS PANDO – META 2018: 1.132 SH



Estado Plurinacional de Bolivia

**MÁS DE 3.510  
PERSONAS  
BENEFICIADAS**

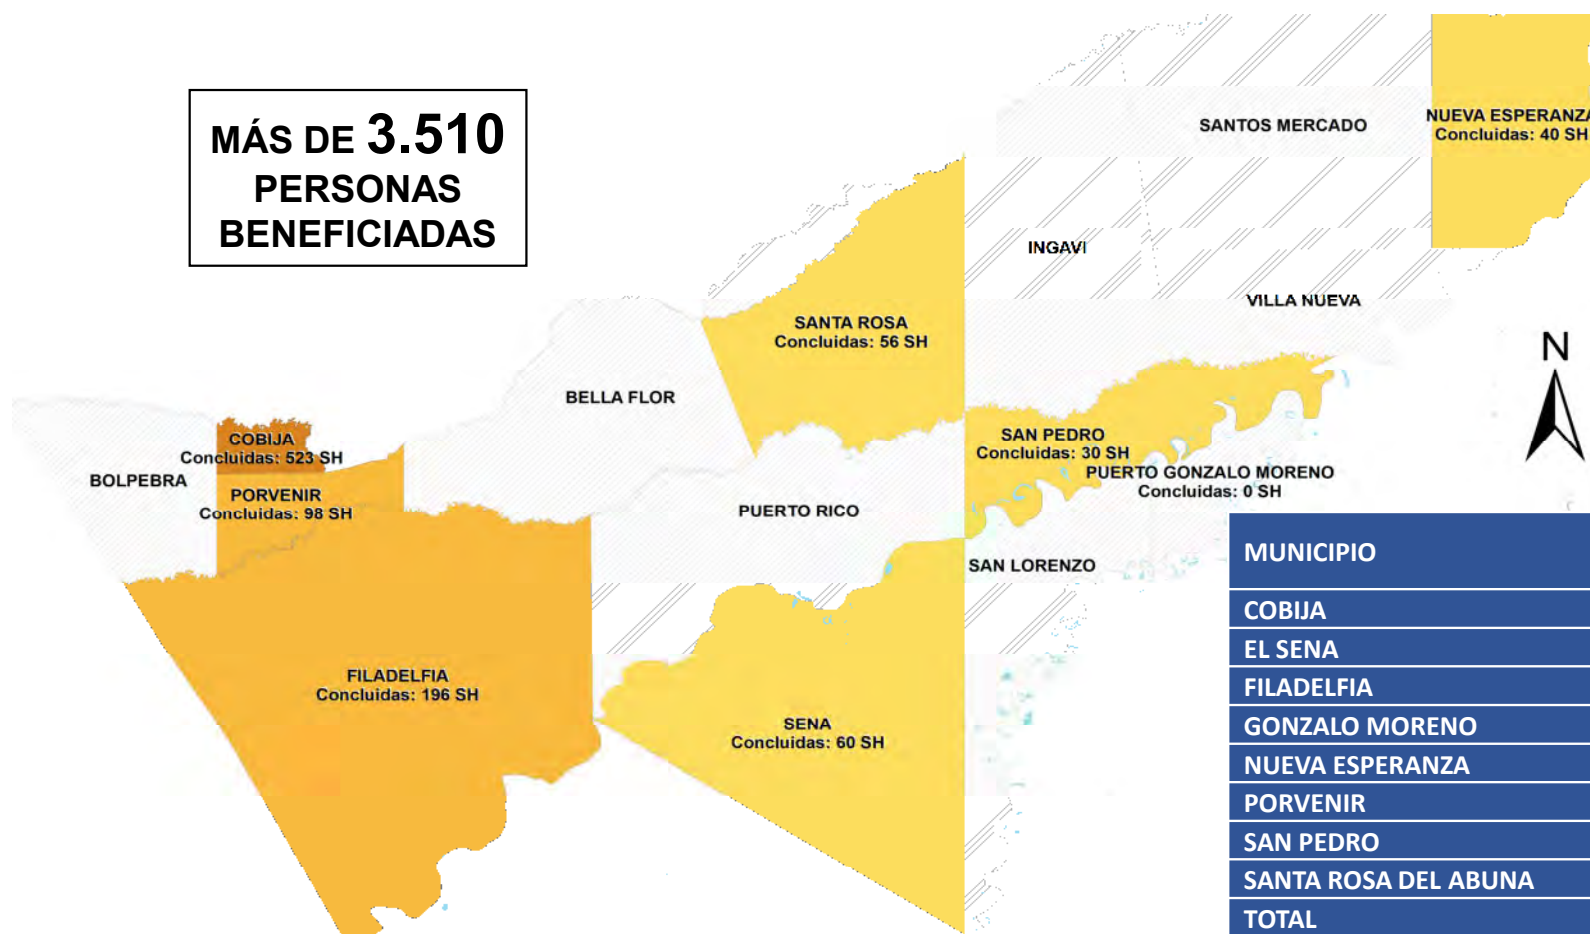

MUNICIPIO	S.H.	S.H.
	PROG.	EJEC.
COBIJA	592	523
EL SENA	87	60
FILADELFIA	196	196
GONZALO MORENO	13	
NUEVA ESPERANZA	40	40
PORVENIR	118	98
SAN PEDRO	30	30
SANTA ROSA DEL ABUNA	56	56
<b>TOTAL</b>	<b>1.132</b>	<b>1.003</b>


Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información - AEVIVIENDA



# MAPA DE INTERVENCIÓN PROYECTOS COMPROMETIDOS POTOSÍ – META 2018: 3.155 SH

MUNICIPIO	S.H.	S.H.
	PROG.	EJEC.
ARAMPAMPA	55	55
BETANZOS	68	-
CAIZA "D"	84	84
CHAQUI	49	49
CHAYANTA	132	132
CKOCHAS	17	17
COLCHA "K"	98	98
COLQUECHACA	80	80
COTAGAITA	57	-
LLALLAGUA	258	73
MOJINETE	30	30
OCURI	94	94
POCOATA	116	116
POTOSI	413	386
SAN PABLO DE LIPEZ	40	-
SAN PEDRO DE BUENA VISTA	149	149
TACOBAMBA	44	44
TINGUIPAYA	276	181
TOMAVE	108	108
TORO TORO	87	87
TUPIZA	401	344
UNCIA	82	82
VILLA DE SACACA	113	113
VILLAZON	251	237
VITICHI	53	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.155</b>	<b>2.559</b>

**MÁS DE 8.956  
PERSONAS  
BENEFICIADAS**

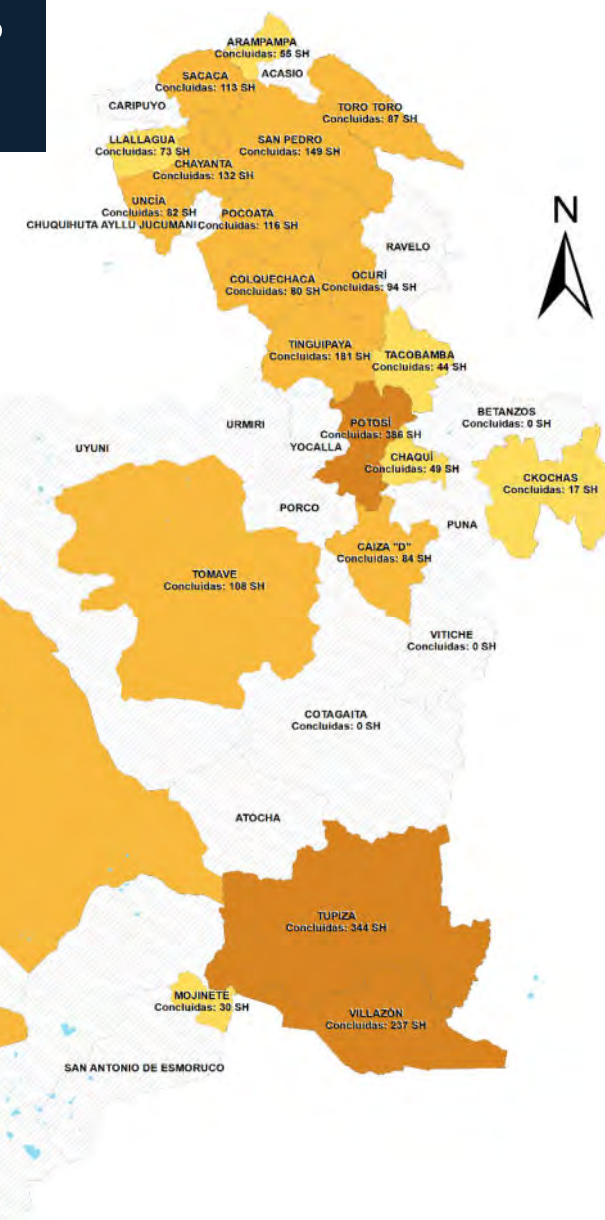

Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información - AEVIVIENDA



Estado Plurinacional de Bolivia



AEVIVIENDA



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA

# MAPA DE INTERVENCIÓN PROYECTOS COMPROMETIDOS SANTA CRUZ – META 2018: 6.556 SH

**MÁS DE 14.647  
PERSONAS  
BENEFICIADAS**




Estado Plurinacional de Bolivia



AEVIVIENDA

MUNICIPIO	S.H. PROG.	S.H. EJEC.
ASCENSION DE GUARAYOS	67	63
BOYUIBE	92	92
BUENA VISTA	117	90
CABEZAS	151	82
CAMIRI	1	-
COTOCA	1.207	747
CUATRO CAÑADAS	43	43
EL PUENTE	80	80
EL TORNO	81	80
LA GUARDIA	148	67
LAGUNILLAS	64	-
MINERO	103	103
MONTERO	270	133
OKINAWA UNO	51	51
PAILON	39	39
PAMPA GRANDE	46	-
PORONGO	110	110
PUERTO QUIJARRO	57	56
PUERTO SUAREZ	55	52
SAN CARLOS	1	-
SAN JOSE DE CHIQUITOS	55	1
SAN JUAN	60	60
SAN JULIAN	157	157
SAN MATIAS	77	-
SAN MIGUEL DE VELASCO	151	83
SAN PEDRO	52	52
SAN RAFAEL	61	61
SANTA CRUZ DE LA SIERRA	2.832	1.615
SANTA ROSA DEL SARA	46	7
URUBICHA	79	79
VALLEGRANDE	34	34
WARNES	49	49
YAPACANI	120	99
<b>TOTAL</b>	<b>6.556</b>	<b>4.185</b>

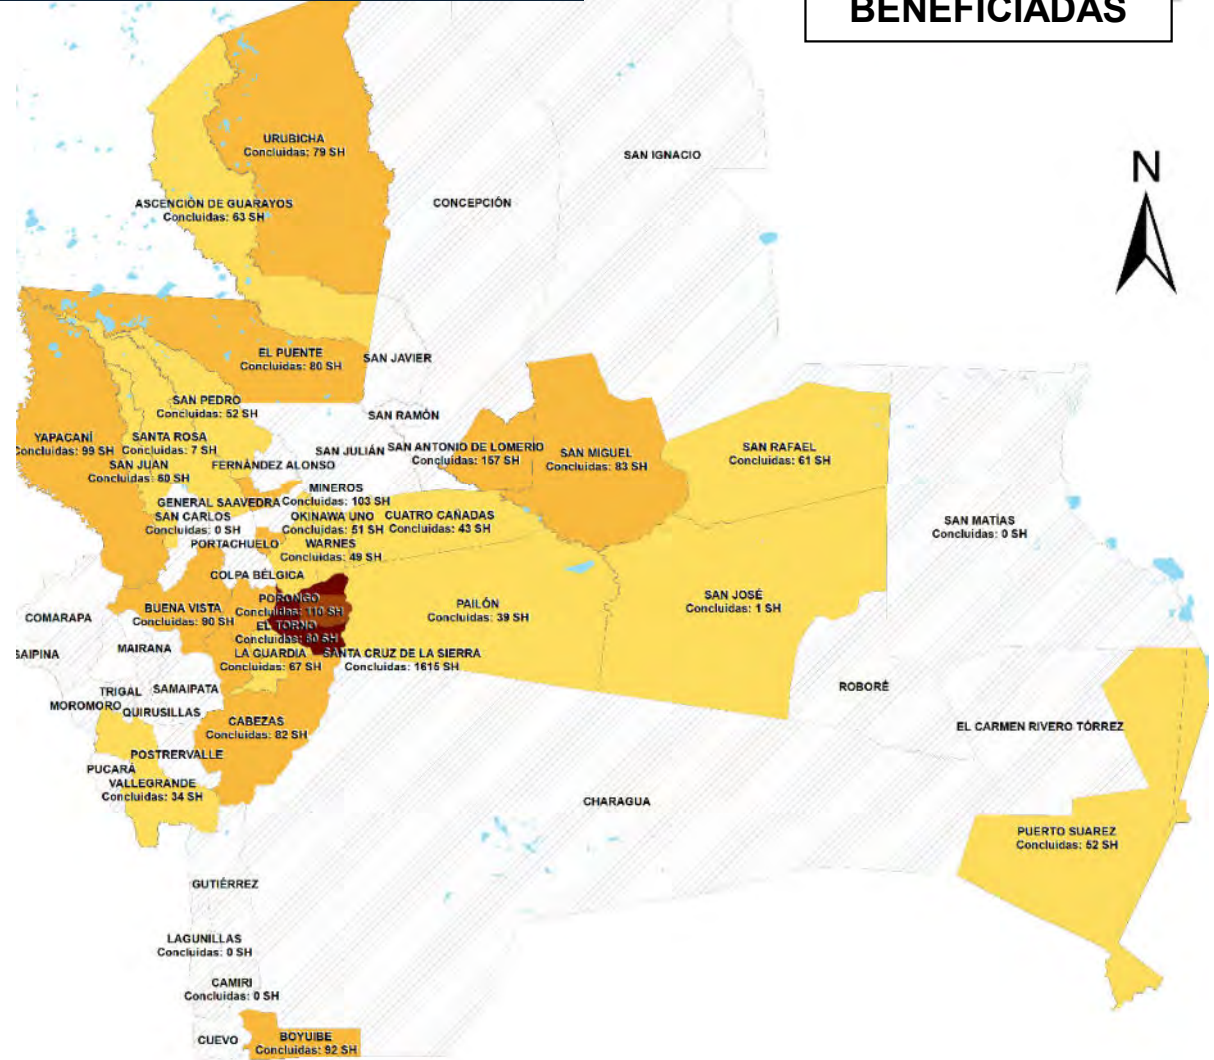

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA



## MAPA DE INTERVENCIÓN PROYECTOS TARIJA META 2018: 1.786 SH

**MÁS DE 4.816  
PERSONAS  
BENEFICIADAS**




Escudo Plurinacional de Bolivia



AEVIVIENDA

MUNICIPIO	S.H.	S.H.
	PROG.	EJEC.
BERMEJO	43	42
CARAPARI	90	40
CERCADO	536	435
EL PUENTE	67	67
ENTRE RIOS	134	120
PADCAYA	161	161
SAN LORENZO	59	58
URIONDO	35	35
VILLA MONTES	86	32
YACUIBA	524	335
YUNCHARA	51	51
<b>TOTAL</b>	<b>1.786</b>	<b>1.376</b>

*Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información - AEVIVIENDA*

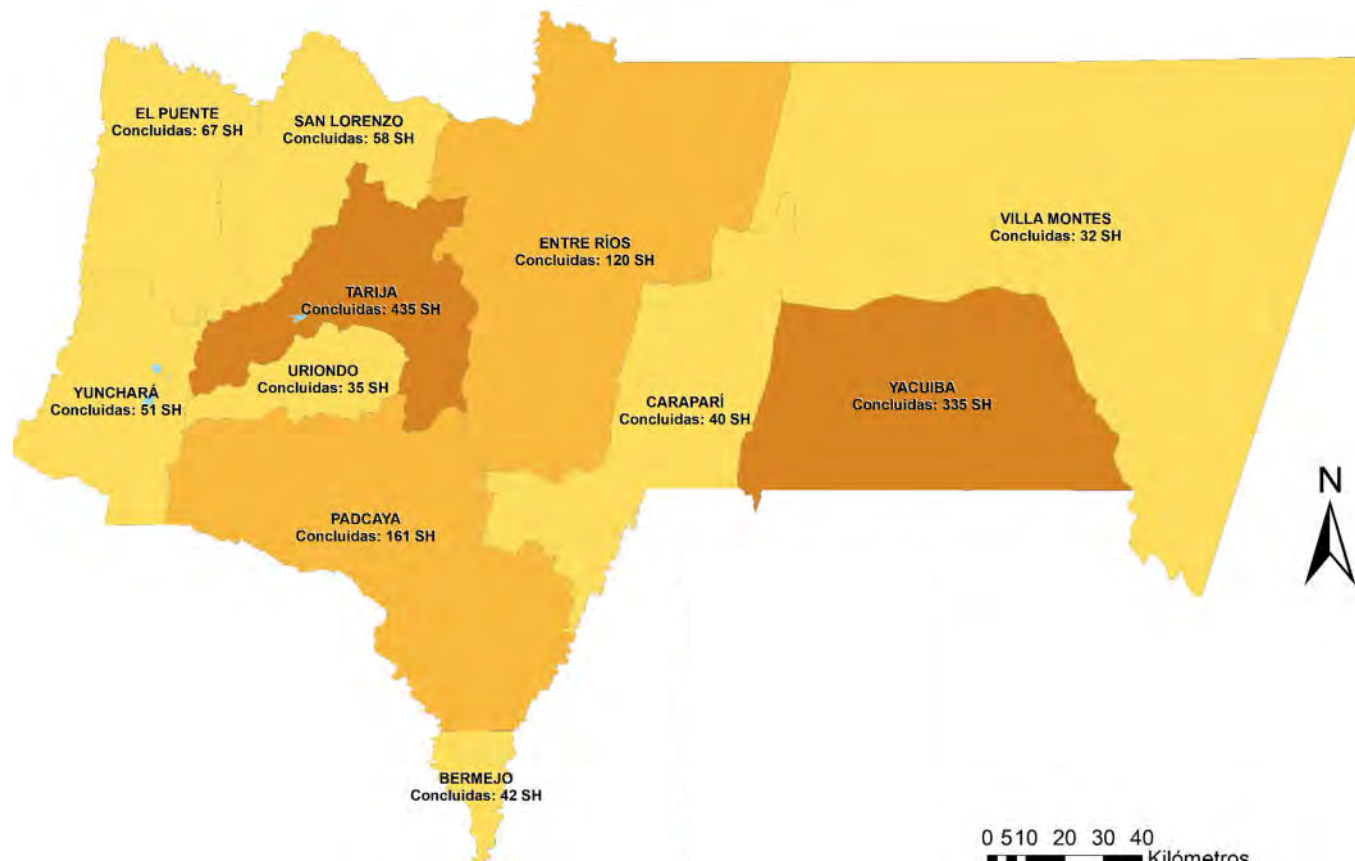

0 5 10 20 30 40  
Kilómetros



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

# RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2018



## GRACIAS !

[www.aevivienda.gob.bo](http://www.aevivienda.gob.bo)

